
1 SERAH TERIMA

Penugasan Team lapangan untuk memenuhi kebutuhan event client dengan detail :

Nama Client	: **Abah Fandi** (Rajawali Music)
Tgl Event	: 16/10/2026
Jam Event	: -
Tgl Loading	**: 15/10/2026**
Jam Loading	**: 22:00**
Lokasi Event	: dwada
Ukuran LED	: 6.00x3.00m SAGA
Jumlah SQM	**: 18 SQM**
Keterangan Lain	: -

Crew 1	: .....
Crew 2	: .....
Crew 3	: .....
Crew 4	: .....
Crew 5	: .....
Crew 6	: .....
Crew 7	: .....

BLUEPRINT LAYOUT PANGGUNG 2D



Dimensi: 10.00m × 6.00m (Level 0.60m)

Detail Teknis Tampak Atas & Depan: Lihat Lembar 4

Kendaraan	: **TRAGA 1**
E toll	: Ada / Siap
Kunci Ban	: Ada / Siap
STNK	: Ada / Siap
Kartu KIR	: Ada / Siap
BardCode BBM	: Ada / Siap

- Dengan menandatangani checklist ini, berarti kamu bertanggung jawab penuh atas isi checklist dan menyatakan bahwa semua kelengkapan sudah dicek dan diserahterimakan dengan teliti dan benar.
- Terdapat 2 Lembar cheklist yang sangat Crusial , dan wajib teliti

KEBERANGKATAN

TTD PIC EVENT	JAM DAN TGL	TTD PIC GUDANG
	15/10/2026 01:42	
(dd)		(Budi Gudang Omah Visual)

PC Kepulangan Barang Wajib Orang yg berbeda

KEPULANGAN

TTD PIC EVENT	JAM DAN TGL	TTD PIC GUDANG
	15/10/2026 01:42	
(ddd)		(Budi Gudang Omah Visual)

2 Cheklist Barang Kerja TEAM Omahvisual LED

No Event : ORD-2026-0005
Nama Client : Abah Fandi

Nama Pic Event : ..... | Nama Pic Gudang : **Budi Gudang Omah Visual** | Tgl Load : 15/10/2026 | Tgl Event : 16/10/2026

NO	Barang Bawaan KE VENUE	Detail	QTY	Keluar	Kembali
TOOLS BOX					
1	Terminal Sambung 200A	Konektor Genset	**1 pcs**		
KABINET & KELISTRIKAN					
2	Kabinet LED 1 Mtr SAGA	TOTAL 18 SQM | 6 BOX	**36 pcs**		
3	Kabinet LED 50cm SAGA	Kombinasi Baris 50cm	**0 pcs**		
4	Power Corn Jumper 1 mtr + 1,5 mtr	Jumper Antar Kabinet	**36 pcs**		
5	Power Corn Jumper Panjang 2-6 mtr	Jumper Sudut / Baris	**6 pcs**		
6	Power Awal (Legrand To Corn)	Distribusi Power Input	**5 pcs**		
7	Power Awal Extender (Legrand Female, Male)	Kabel Tarikan Panjang	**2 pcs**		
8	Lan Jumper	Data Interconnect Antar Kabinet	**36 pcs**		
9	Lan Awal panjang	Main Data Send Port	**2 pcs**		
10	Lan Awal pendek	Port Cadangan	**2 pcs**		
11	Converter Legrand to Steker	Adaptor PLN	**2 pcs**		
12	Besi Ground dan Kabel Grounding 50 Mtr	Safety Grounding	**1 roll**		
13	Konektor Kabel panel + terminal Sambung	Terminal Distribusi	**1 set**		
14	Panel Listrik 16A	12 MCB	**1 unit**		
15	Kabel Terminal FOH 25 / 50 / 100 mtr	FOH Main Control Cable	**1 roll**		
16	Kabel babok 20-50 Mtr	Power Main Feeder	**1 roll**		
17	Kupu2 (Kunci Sambung Panel)	Pengunci Antar Box	**72 pcs**		
18	Baut panjang	Rigging Lock Bolt	**20 pcs**		
19	Baut Pendek	Bracket Lock Bolt	**20 pcs**		
20	Kabel FO (Fiber Optik)	2 Core Standby	**1 roll**		
21	Terpal Pelindung Layar	Anti Hujan / Debu	**2 lembar**		
TOOLS BOX					
22	Tang Kombinasi	Toolbox Utama	**1 pcs**		
23	Tang Potong	Toolbox Utama	**1 pcs**		
24	Obeng + -	Toolbox Utama	**1 set**		
25	Tang Amper	Digital Clamp Meter	**1 unit**		
26	Crimping Rj45	Toolbox Utama	**1 pcs**		
27	Rj 45 Konektor	Spare Konektor LAN	**10 pcs**		
28	Lan Chekker + Baterei	Tester Kabel Data	**1 set**		
29	Kunci Y	Kunci Pas Y	**1 pcs**		
30	Tang Kupas	Wire Stripper	**1 pcs**		
31	Cutter	Pisau Cutter	**1 pcs**		
32	Kunci L	Hex Key Set	**1 set**		
33	Linggis 35cm / Orange	Pengungkit Level Panggung	**1 pcs**		
34	Sarung Tangan 3 pasang	Safety Gloves	**3 pasang**		
35	Headlamp	Lampu Kepala Loading Malam	**2 pcs**		
GROUND STAKE					
36	Besi Profil 2 Mtr	Tiang Tegak Rigging	**4 batang**		
37	Besi Profil 1 Mtr	Tiang Sambung	**4 batang**		
38	Ganjel Triplek	Waterpass Leveler	**10 pcs**		
39	Besi H 1,5 Mtr	Base Footing	**4 batang**		
40	Besi H 2 Mtr	Base Footing Panjang	**2 batang**		
41	Besi H 1 Mtr	Base Footing Pendek	**2 batang**		
42	Cat Walk	Balkon Servis Belakang	**2 unit**		
43	Pemberat Jirgen + Webbing Ungu	Ballast Water Jug	**4 unit**		
44	Pemberat Beton / Barbel	10KG / 20KG	**4 unit**		
45	Tali Tampar	Tali Pengikat Belakang	**2 roll**		
STAGE LEVEL					
46	Panggung Rangka 40cm / 50cm	Level Panggung Bawah Layar	**4 modul**		
47	Triplek Alas Stage	Alas Panggung	**4 lembar**		
48	Kain Hitam Penutup Stage	Skirting Stage	**1 set**		
49	Galon Air Besar	Pemberat Tambahan	**2 unit**		

3 CHEKLIST PIC Omahvisual LED

No Event : ORD-2026-0005 • Client : Abah Fandi

NO	Barang Bawaan KE VENUE	Detail	QTY	Keluar	Kembali
KIT OPERATOR					
1	Laptop Operator	Laptop Utama Show	**1 unit**		
2	Charger + Kabel Power Laptop	Original Adapter	**1 set**		
3	Mouse + Mousepad	Operator Control	**1 set**		
4	KABEL HDMI 4K 1M (2 Biji)	High Speed 4K Cable	**2 pcs**		
5	HDMI Splitter 4 Port	Distributor Sinyal Video	**1 unit**		
6	Capture Card (2 Unit)	Live Cam & Input Feed	**2 unit**		
7	Test Pen + Volt Meter + Minyak Wangi	Safety Check & Comfort	**1 set**		
8	HT 2 Unit + Charger + Pouch	Komunikasi PIC & Operator	**2 unit**		
9	Soundcard + Kabel Audio Jack + Flashdisk	Audio Feed & Emergency Media	**1 set**		
PROSESOR					
10	Prosesor Novastar VX400 / VX4S	Main Display Controller	**1 unit**		
11	Kabel AC Power Prosesor	Kabel Daya Utama	**1 pcs**		
12	Kabel Setting (USB Type B to A)	NovaLCT Software Config	**1 pcs**		
13	Kabel HDMI to HDMI 4K	Input Display	**2 pcs**		
14	Kabel DVI to HDMI / DP to HDMI	Video Input Cadangan	**1 pcs**		
15	Module SFP Fiber Optic	Optical Transceiver	**1 pcs**		
ATK TAMBAHAN					
16	Wrapping Plastik Roll	Pelindung Layar Saat Kirim	**1 roll**		
17	Isolasi Kertas Besar & Kecil	Marking Panggung & Labeling	**2 roll**		
18	Isolasi Hitam Listrik	Safety Kabel Audio/Video	**2 roll**		
19	Isolasi Bening	Packing	**1 roll**		
20	Spidol Boardmarker & Snowman	Label Box & Checklist	**2 pcs**		
SPARE PART LED					
21	Modul LED Spare SAGA	Modul Cadangan (Batch & Kalibrasi Cocok)	**3 pcs**		
22	Receiving Card (K8 / K5 / E80)	Receiving Card Cadangan Terprogram	**1 pcs**		
23	Power Box / Batok Belakang	Cover Power Cadangan	**1 pcs**		
24	Power Supply Unit (PSU 5V 40A/60A)	Power Supply Cadangan	**1 pcs**		
25	Tool Service Kit SAGA Lengkap	Masker, Obeng Khusus, Magnet Vakum	**1 set**		
LED GANTUNG					
26	Hanging Bar SAGA	Bar Gantung Atas Layar	**0 batang**		
27	Takel 10 Mtr (1 TON / 2 TON)	Manual Chain Hoist	**0 unit**		
28	Webbing Hijau 3 Mtr / Putih 5 Mtr	Sling Webbing Pengikat Truss	**0 pcs**		
29	Clamp C & Baut Hanging	Klem Truss Rigging	**0 pcs**		
30	Body Harness & Safety Vest	APD Bekerja di Ketinggian	**0 set**		
31	Tangga Teleskopik	Tangga Lipat Aluminium	**1 unit**		
PERALATAN TIDUR					
32	Hammock	Istirahat Standby Event	**2 pcs**		
33	Kasur Lipat / Matras	Istirahat Standby Event	**2 pcs**		
34	Bantal & Sleeping Bag	Istirahat Standby Event	**2 set**		
35	Ranjang Tidur Lipat	Velbed Portabel	**1 unit**		

4 BLUEPRINT TEKNIS: TATA LETAK PANGGUNG & FORMASI LAYAR LED


Engineering Stage Plot & LED Screen Rigging Blueprint • Omahvisual LED

No. SPK: SPK-2026-0005
No. Event: ORD-2026-0005

Client: Abah Fandi	**Venue:** dwada	**Tgl Event:** 16/10/2026 (Load: 15/10/2026)
Ukuran Panggung: 10.00m × 6.00m (Level +0.60m)	**Total Layar:** 1 Unit (18 m²)	**PIC Event:** -


1. TAMPAK ATAS (TOP-DOWN FLOOR PLAN) — BIDANG PANGGUNG & FORMASI LAYAR TERHADAP PENONTON

Grid Skala: 1 Kotak = 1 Meter

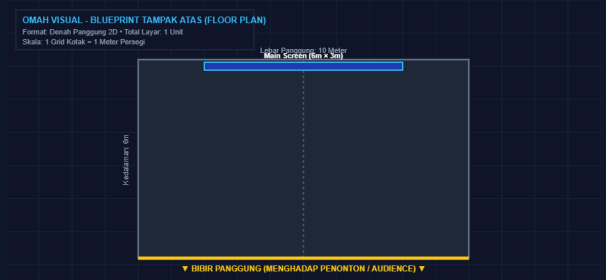

2. TAMPAK DEPAN (FRONT ELEVATION) — LEVEL TINGGI PANGGUNG, ELEVASI LAYAR & TRUSS GANTUNG

Perspektif Penonton

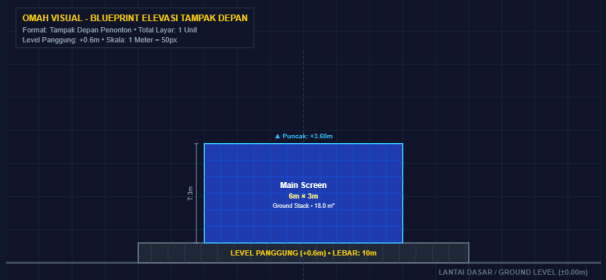

NO	Nama Posisi Layar	Dimensi Fisik	Luas SQM	Total Kabinet	Metode Pasang	Prosesor & Sinyal	Catatan Rigging & Safety
1	**Main Screen**	6.00m × 3.00m	**18.00 m²**	36 Kabinet (6 Box)	**Ground Stack**	Novastar VX400 / VX4S	Perhatikan level kerataan & ballast panggung

PERNYATAAN KELAYAKAN INSTALASI RIGGING & VISUAL PANGGUNG:

1. Kerataan lantai level panggung telah dicek menggunakan waterpass sebelum modul kabinet pertama dipasang.
2. Sistem penguncian kabinet (quick-lock) dan safety wire terpasang lengkap sesuai standar keselamatan kerja.
3. Distribusi beban daya listrik telah dibagi merata dan grounding terpasang aman.

TTD PIC RIGGING / STAGE LEAD	TTD OPERATOR VISUAL / SYSTEM	TTD PIC EVENT (LAPANGAN)
(.....)	(.....)	(.....)
